FRYDENSPARK ~~31.01.2024~~ ~~15.10.2024~~ 20.11.2024

		boliger pr. blok	Genhusning, udflytnings-periode	DAB drift/ ejendom gennemgang	Byggeperiode	DAB Drift/ ejendom v. gennemgang	Genhusning, indflytnings-periode
Blok 1	Grækenlandsvej 105, 107, 109 og 111	24	09.02.23	10.02.2023 - 16.02.23	17.02.23 - 04.04.24	05.04.24 - 12.04.24	15.04.24 - 19.04.24
Blok 7	Greisvej 36, 38 og 40	18	28.08.23 - 01.09.23	04.09.2023 - 08.09.23	08.09.23 - 13.08.24	14.08.24 - 20.08.24	21.08.24 - 27.**08.24**
Blok 8	Greisvej 42, 44 og 46	18	05.12.23 11.12.23	12.12.2023 - 18.12.23	18.12.23 - 29.10.24	30.10.24 - 05.11.24	06.11.24 12.11.24
Blok 2	Parosvej 18, 20, 22 og 24	24	21.03.24 27.03.24	02.04.24 - 08.04.24	08.04.24 - 24.03.25	25.03.25 - 01.04.25	02.04.25 09.04.25
	Driftkontor				29.01.24	19.02.24	
Blok 3	Parosvej 13, 15, 17 og 19	24	18.07.24 24.07.24	25.07.24 - 01.08.24	01.08.24 - 05.09.25	05.09.25 - 11.09.25	11.09.25 18.09.25
Blok 9	Olymposvej 2, 4 og 6	18	16.10.24 23.10.24	23.10.24 - 29.10.24	29.10.24 - 11.11.25	11.11.25 - 18.11.25	18.11.25 25.11.25
Blok 4	Kastrupvej 158A, 158B, 158C og 158D	24	31.03.25 07.04.25	07.04.25 - 14.04.25	14.04.25 - 05.03.26	05.03.26 - 12.03.26	12.03.26 19.03.26
Blok 14	Kastrupvej 160A, 160B, 160C og 160D	24	08.08.25 15.08.25	15.08.25 - 22.08.25	22.08.25 - 18.06.26	18.06.26 - 25.06.26	25.06.26 02.07.26
Blok 13	Greisvej 68, 70, 72 og 74	24	28.10.25 04.11.25	04.11.25 - 11.11.25	11.11.25 - 25.09.26	25.09.26 - 02.10.26	02.10.26 09.10.26
Blok 12	Greisvej 62, 64 og 66	18	19.02.26 26.02.26	26.02.26 - 05.03.26	05.03.26 - 20.01.27	20.01.27 - 27.01.27	27.01.27 03.02.27
Blok 11	Greisvej 54, 56, 58 og 60	24	04.06.26 11.06.26	11.06.26 - 18.06.26	18.06.26 - 29.04.27	29.04.27 - 06.05.27	06.05.27 13.05.27
Blok 10	Greisvej 48, 50 og 52	18	14.09.26 21.09.26	21.09.26 28.09.26	28.09.26 - 11.08.27	11.08.27 - 18.08.27	18.08.27 25.08.27

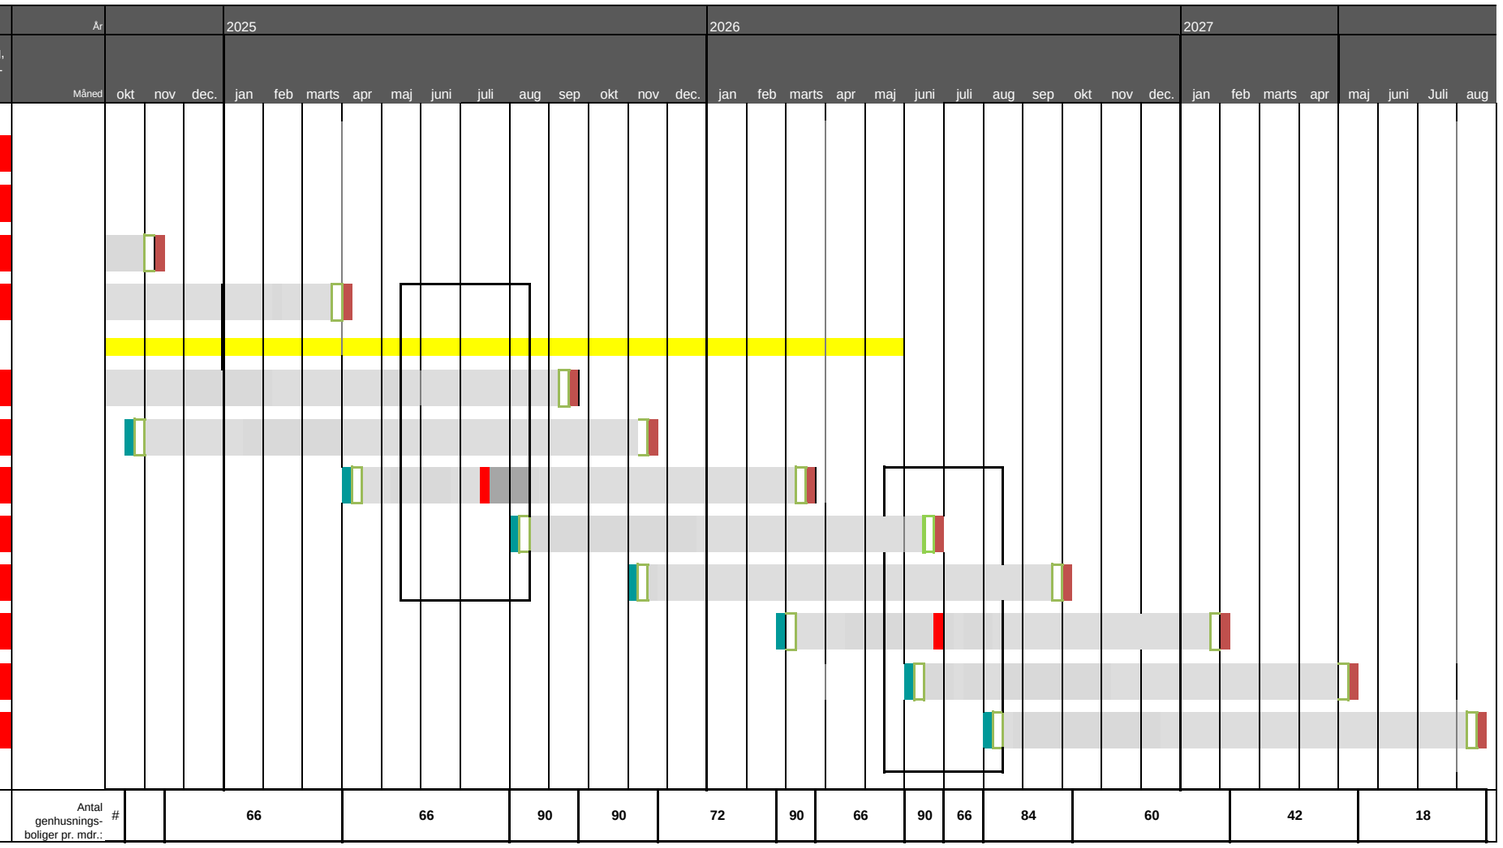

Overdækning op ca. 4 mdr efter opstart

Risiko for, at overdækning lukker mursejler inde i huller i taget
